綾部市　橋梁長寿命化修繕計画





令和８年４月

1.綾部市の橋梁の現状

令和７年度末現在において、綾部市には 444 橋の点検対象橋梁があります。

そのうち、建設後 50 年以上経過した橋梁が占める割合は、現在約 59%（263 橋）あり、20 年後には約 88%（393 橋）と橋梁の老朽化が一段と進行していきます。

一方、橋や道路の老朽化が進むに従い傷みがひどくなり、市民活動を支える橋や道路を取り巻く環境は、今後ますます厳しさを増すものと考えられます。

これらの高齢化を迎える橋梁群に対して、従来の『悪くなってから対策をとる』対症療法型の維持管理を続けた場合、橋梁の修繕・架替えに要する費用が増大となることが懸念されます。

現在では、修繕などの対策を、劣化損傷の早い段階で対策を行うことが効果的かつ経済的であることが分かっています。（予防保全型）

人間の体も同じです。図１のように健康診断を定期的に受診して早期治療（薬や注射による治療）を行う予防保全型では、医療費のトータルコストが抑えられ「元気で、長生き」できることにつながります。橋梁も定期的に点検（健康診断）をして、予防的な修繕（早期治療）を行うことが重要です。

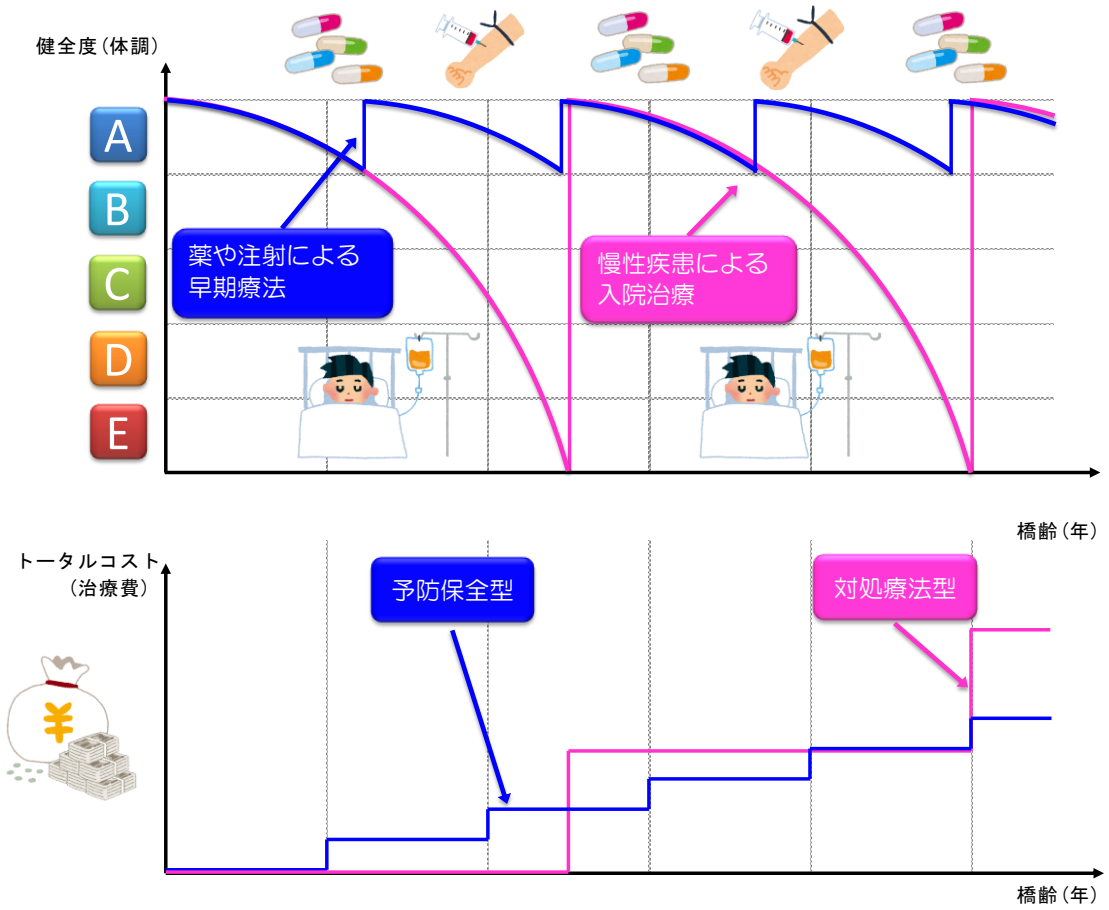


図　１　対症療法型と予防保全型のイメージ

対処療法型・・・これまでの一般的な維持管理手法で、使用上の問題が起きた段階で補修する。

予防保全型・・・劣化損傷を早い段階で補修する。

2.健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

橋梁の点検は、図２に示すように日常点検、定期点検、臨時点検、詳細点検に区分されます。

橋梁維持管理の一環として現状を把握し、安全性や耐久性に影響すると考えられる損傷を早期に発見し、対策を行う事により、常に橋梁が良好な状態であることを目指します。

定期点検は、橋梁定期点検要領に基づいて、近接目視点検を行い、各部材の状態を把握・診断し、道路橋に必要な対策措置を判定する情報を収集することを目的としています。

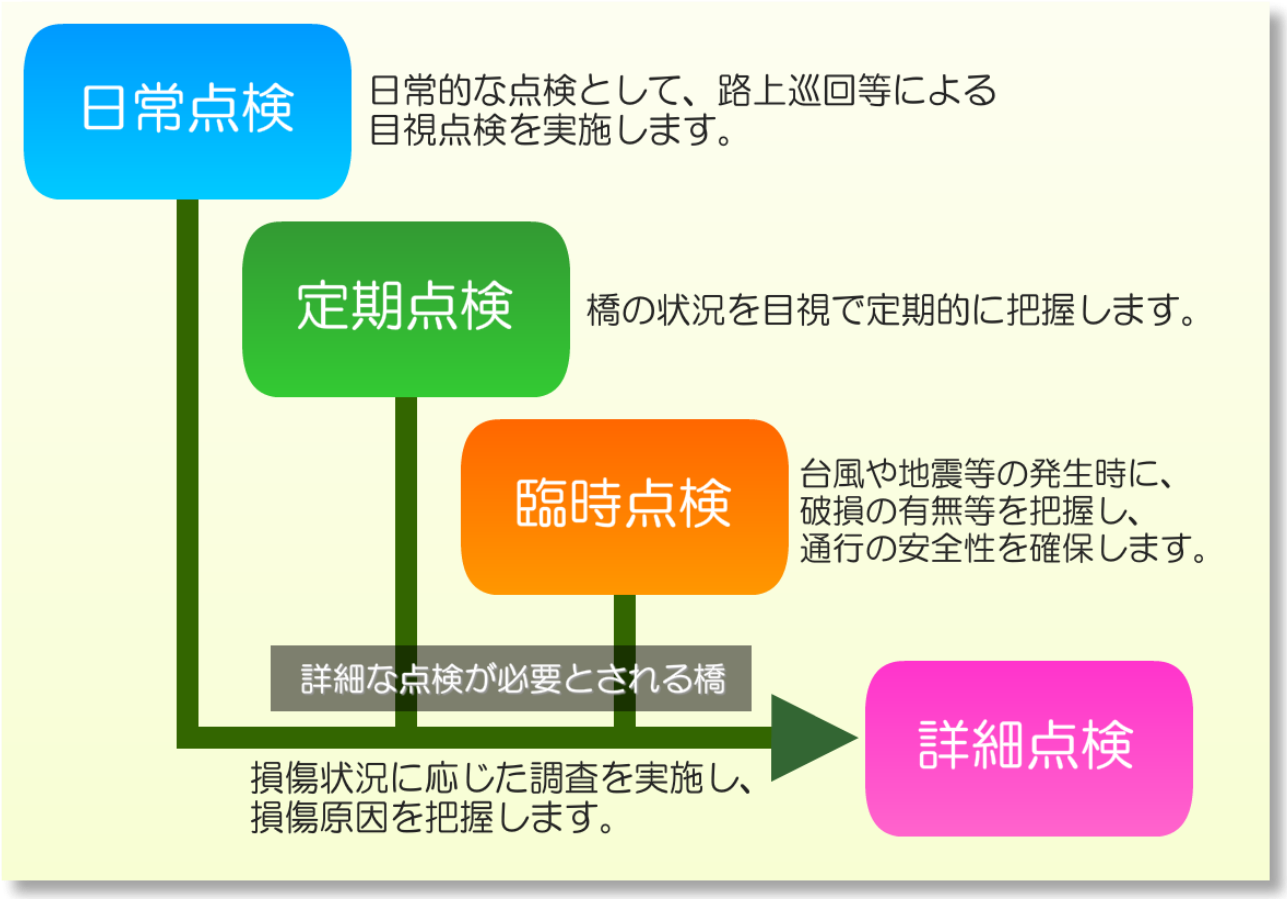


図２　橋梁点検フロー

3.本計画による修繕の内容

橋の塗装塗替えや傷んだ箇所の補修などを計画的に順次実施します。

ひびわれ



鉄筋の露出



下部工の変状



腐食



図３　橋梁の主な損傷例

4.長寿命化及び修繕・架替えに係わる費用の縮減に関する基本的な方針

① 定期点検による橋梁状態の継続的な把握を行い、橋梁の安全性を確保します。
② 「対症療法型」の管理から「予防保全型」の管理への移行により、コストの縮減を行います。
③ 中長期的な観点から、対策の優先順位を判断します。
④ 個々の橋梁の重要度や、損傷程度を総合的に評価した修繕計画を策定することにより、効率的な維持管理を行います。

5.新技術の活用方針及び費用縮減方針

1．新技術の活用方針

橋梁の点検や修繕工事の実施にあたっては、新技術情報提供システム（ＮＥＴＩＳ）や点検支援技術性能カタログなどを参考に、新技術の活用を検討し、費用縮減や点検・修繕工事に係る維持管理の効率化を図ります。

2．費用縮減方針

①点検費用の縮減

定期点検においては、近接目視が困難な橋梁や大規模な橋梁点検車が必要となる橋梁を対象として、ドローン等の新技術を活用した点検を実施し、令和 12 年度までに以下の費用縮減を目標とします。

対象橋梁：20 橋　　費用縮減額：350 万円

②集約化・撤去による縮減

維持管理の費用を縮減するため、交通量や代替路の有無、橋梁の健全度、地域の意見等を考慮した上で、施設の集約化や撤去等が可能な橋梁の有無について検討します。

令和 12 年度までに１橋を集約撤去し、点検等の維持管理費用を約５０万円縮減することを目指します。

③修繕費用の縮減

修繕工事において、新技術の導入を図り、修繕費用の縮減を目指します。

また、新技術の導入により、今後の修繕の実施頻度を減らし、維持管理に係る費用を縮減します。令和 12 年度までに以下の費用縮減を目標とします。

対象橋梁：10 橋　　費用縮減額：1,500 万円

6.長寿命化修繕計画による効果

本計画を実施することで、橋の寿命を 10 年から 50 年以上延ばすことができ、100 年以上供用することも可能といわれています。また、橋梁を維持する費用は予防保全型で補修を行うことにより、大幅なコスト縮減も図ることができると期待されます。

また、損傷に起因する通行制限等が減少し、道路の安全性・信頼性が確保されます。

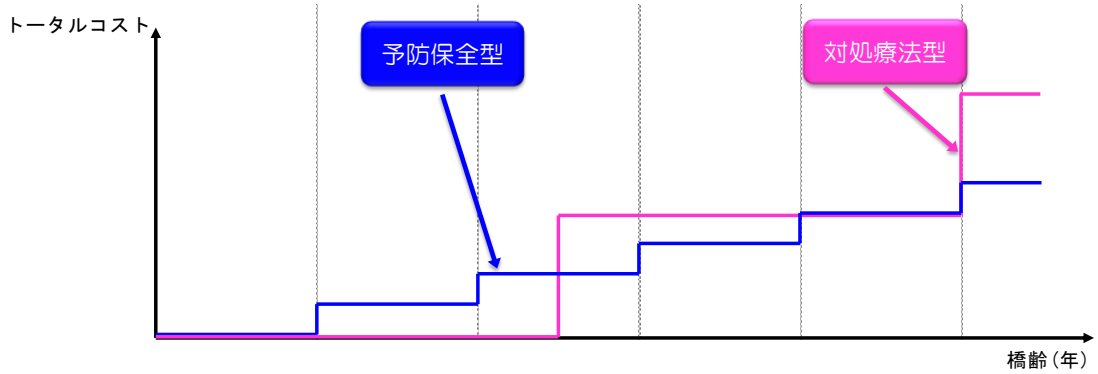


図 4　対症療法型と予防保全型の工事費予測

綾部市は、「対症療法型」から「予防保全型」への転換を図り、橋梁の長寿命化および効率的な維持管理によるコストの縮減を図る目的で、長寿命化修繕計画を策定しました。

今後本計画に基づいて橋の点検、維持、対策を繰り返し行うことにより、橋の適切な管理を積極的にすすめ、経済的に安心安全な道路ネットワークを維持するように努めていきます。



綾部市

〒623-8501 京都府綾部市若竹町 8 番地の 1
TEL 0773-42-3280

2015 年（平成 27 年） 3 月作成
2024 年（令和 6 年）12 月改訂
2026 年（令和 8 年） 3 月改訂

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：⟷ 対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	所在地	橋長(m)	幅員(m)	橋梁の種類	架設年度	供用年数	最新点検年次	診断結果(判定)	対策の内容・時期										事業費(千円)
											R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	
高倉橋	市道	高倉畷線	綾部市西坂町	13.5	6.2	ＰＣ橋：プレテン中空床版	1994	32	R4	Ⅰ		点検									1,200
尾ノ城橋	市道	尾ノ城線	綾部市西坂町	10.5	5.7	ＰＣ橋：プレテン中空床版	1995	31	R4	Ⅰ		点検									1,200
照用橋	市道	鷹栖橋上線	東山町受戸成２８の２	52.05	3.5	鋼溶接橋：トラス橋	2000	26	R3	Ⅱ	点検					点検					4,000
大安橋	市道	中筋大安線	綾部市中筋町	19.4	6.7	鋼溶接橋：Ｉ桁（合成）	1973	53	R4	Ⅱ		点検					点検				1,700
上原橋	市道	上原線	広瀬町上ノ町１３２	96.5	3.7	鋼溶接橋：Ｉ桁（吊橋）	1954	72	R3	Ⅱ	点検 床版:塗装 等					点検					43,772
五郎橋	市道	広瀬橋上線	広瀬町宮ノ前３７	43.55	4.5	ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁	1956	70	R3	Ⅱ	点検					点検					2,200
十倉橋	市道	向十倉線	十倉名畑町欠戸６	70.8	5	ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁	1956	70	R3	Ⅱ	点検					点検					4,000
西地橋	市道	向十倉線	十倉名畑町欠戸６	48.94	3.5	ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁	1958	68	R3	Ⅱ	点検					点検		設計	主部材:表面被覆 等		9,422
下佃橋	市道	佃線	佃町野畑２６	49.12	3.5	ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁	1962	64	R3	Ⅱ	点検					点検					2,200
上佃橋	市道	佃線	佃町野畑２６	61.9	3.5	ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁	1963	63	R3	Ⅱ	点検					点検					4,000
下忠橋	市道	忠線	忠町段ノ下６・７合地	45.43	3.5	ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁	1970	56	R3	Ⅱ	点検					点検					2,200
上忠橋	市道	忠線	忠町段ノ下６・７合地	56.05	4	鋼溶接橋：Ｈ形鋼（合成）	1989	37	R3	Ⅰ	点検					点検					4,000
大迫橋	市道	下八田中央１号線	下八田町大迫１１	29.5	4.8	鋼溶接橋：Ｉ桁（合成）	1974	52	R3	Ⅰ	点検					点検					1,800
岡橋	市道	岡安線	綾部市岡安町	21.4	4.8	鋼溶接橋：Ｉ桁（合成）	1975	51	R4	Ⅱ		点検					点検				1,800
黒谷橋	市道	黒谷線	綾部市黒谷町	17.8	5.1	ＰＣ橋：プレテンＴ桁	1979	47	R4	Ⅱ		点検					点検				1,700
和木大橋	市道	和木橋線	西原町中ヶ沢３１	95.9	5.8	鋼溶接橋：Ｉ桁（非合成）	1973	53	R3	Ⅱ	点検					点検					4,000
小山橋	市道	小山線	睦寄町小山ノ下７６の１	69.96	3.1	ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁	1961	65	R3	Ⅱ	点検					点検					4,000
真野橋	市道	浅原線	睦合町井谷１の１	70.5	4.6	ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁	1957	69	R3	Ⅱ	点検					点検					4,000
大手橋	市道	瀬尾谷線	八津合町岸ノ下１	66.02	4.6	ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁	1955	71	R3	Ⅱ	点検					点検					4,000
川東橋	市道	瀬尾谷片山線	八津合町瀬尾口	90.2	4.5	ＲＣ橋：ＲＣ桁橋（その他）	1971	55	R3	Ⅱ	点検 橋脚:断面修復 等					点検					20,489
弓削橋	市道	大町弓削線	五津合町村前５５	63.25	5	ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁	1957	69	R3	Ⅱ	点検					点検					4,000
宮大橋	市道	市道吉田寺内線	綾部市五津合町寺内	31.4	4	ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁	1956	70	R2	Ⅱ					点検					点検	2,200
睦志橋	市道	市道睦志線	綾部市五津合町下西	30.5	4	ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁	1969	57	R2	Ⅱ					点検					点検	2,200
別当橋	市道	市道別当線	綾部市五泉町高畑	15.4	3.5	Ｈ型鋼：Ｈ形鋼（不明）	1976	50	R2	Ⅱ					点検	設計	主部材:塗装 等			点検	4,536
久保橋	市道	市道市志線	綾部市五泉町家尻	15.8	4.4	ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁	1963	63	R2	Ⅱ					点検					点検	1,700
段地橋	市道	市道市志線	綾部市五泉町段ノ下	15.92	4.4	ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁	1963	63	R2	Ⅱ					点検					点検	1,700
どんど橋	市道	市道市志線	綾部市五泉町芝原	15.3	4.4	ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁	1962	64	R2	Ⅱ					点検					点検	1,700
志古田橋	市道	志古田線	睦寄町在ノ前	63.2	3.9	ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁	1957	69	R3	Ⅱ	点検					点検					4,000
兼里橋	市道	市場有安線	睦寄町市場前	50.2	3.7	Ｈ型鋼：Ｈ形鋼（不明）	1972	54	R3	Ⅱ	点検					点検					4,000
坂下橋	市道	下河原葛尾線	睦寄町上河原２	64.15	3.7	鋼溶接橋：Ｉ桁（合成）	1972	54	R3	Ⅱ	点検					点検					4,000
鳥垣橋	市道	下河原葛尾線	睦寄町鳥垣下	27.2	6.7	ＰＣ橋：ポステンＴ桁	1993	33	R3	Ⅰ	点検					点検					1,800
有安橋	市道	下河原葛尾線	睦寄町有安下	50.1	3.6	ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁	1962	64	R3	Ⅱ	点検					点検					4,000
八代橋	市道	八代線	古屋岡町三反田	50	3.7	Ｈ型鋼：Ｈ形鋼（不明）	1973	53	R3	Ⅱ	点検					点検					2,200
石ケ谷橋	市道	石ケ谷線	古屋岡町シュリ	27.6	3.5	Ｈ型鋼：Ｈ形鋼（不明）	1977	49	R3	Ⅱ	点検					点検					1,800
平垣橋	市道	平垣庄畑線	古屋岡町平垣ノ上	28.2	3.5	Ｈ型鋼：Ｈ形鋼（不明）	1976	50	R3	Ⅲ	点検				設計	点検 主部材:緊急補修 等					13,676
庄畑橋	市道	平垣庄畑線	古屋岡町庄畑上	25.83	2.5	Ｈ型鋼：Ｈ形鋼（非合成）	2000	26	R3	Ⅱ	点検					点検					1,800
朝根橋	市道	市道朝根線	綾部市故屋岡町庄畑	22.94	3.3	ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁	1962	64	R2	Ⅱ					点検					点検	1,800
田の谷橋	市道	田ノ谷線	綾部市光野町柿ノ木谷	24.5	3.1	Ｈ型鋼：Ｈ形鋼（不明）	1972	54	R2	Ⅱ					点検	設計	主部材:塗装 等			点検	5,820
船迫橋	市道	市道舟迫線	綾部市光野町原口	15.6	2.9	ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁	1961	65	R2	Ⅱ					点検					点検	1,700
沢田橋	市道	市道沢田線	綾部市老富町下小谷	15.95	3.5	Ｈ型鋼：Ｈ形鋼（不明）	1976	50	R2	Ⅱ					点検・設計	主部材:緊急補修 等				点検	5,864

凡例：◀―▶ 対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	所在地	橋長(m)	幅員(m)	橋梁の種類	架設年度	供用年数	最新点検年次	診断結果（判定）	対策の内容・時期 R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	事業費（千円）
みのだ橋	市道	市道栃在中線	綾部市老富町ミノ田	15	2.9	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1976	50	R2	Ⅱ					点検					点検	1,200
猫橋	市道	綾部河守線	綾部市新庄町	47.58	4.6	鋼溶接橋：Ｉ桁（合成）	1975	51	R4	Ⅱ	橋脚:断面修復 等	点検					点検	設計	主部材:塗装 等		28,548
岩井橋	市道	山田岩井線	綾部市井田町	48.1	6	ＰＣ橋：プレテンＴ桁	1987	39	R4	Ⅰ		点検					点検				2,200
立牧橋	市道	栗豊里線	綾部市石原町	58.2	6.2	鋼溶接橋：Ｉ桁（非合成）	2004	22	R4	Ⅱ		点検					点検				4,000
猫橋	市道	楞厳寺奥小西線	綾部市館町	52.3	3.1	鋼溶接橋：Ｉ桁（合成）	1967	59	R4	Ⅱ	橋台:断面修復 等	点検					点検				14,799
唐部橋	市道	唐部今田線	綾部市今田町	43.02	4.6	鋼溶接橋：Ｉ桁（合成）	1977	49	R4	Ⅱ	橋脚:断面修復 等	点検					点検				13,241
今田橋	市道	舘今田線	綾部市今田町	42.9	3.6	鋼溶接橋：Ｉ桁（合成）	1973	53	R4	Ⅱ	主部材:塗装 等	点検					点検				4,598
西地橋	市道	物部鍛冶屋線	綾部市物部町	14.9	3.9	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1981	45	R4	Ⅱ		点検					点検				1,200
開田橋	市道	開田線	綾部市新庄町	17.45	4.7	鋼溶接橋：Ｉ桁（非合成）	1982	44	R4	Ⅱ	橋台:断面修復 等	点検					点検				10,893
小田橋	市道	深八田古線	綾部市新庄町	43.08	3.1	鋼溶接橋：Ｉ桁（合成）	1983	43	R4	Ⅱ	橋脚:断面修復 等	点検					点検	設計	主部材:塗装 等		22,620
高橋	市道	新庄本線	綾部市新庄町	44.87	7.7	鋼溶接橋：Ｉ桁（合成）	1994	32	R4	Ⅱ	橋脚:断面修復 等	点検					点検				20,571
樋の口橋（既設）	市道	須波岐東物部線	綾部市物部町	32.1	6.6	ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁	1966	60	R4	Ⅱ		点検					点検		設計	主部材:表面被覆 等	18,228
樋の口橋（拡幅）	市道	須波岐東物部線	綾部市物部町	32.3	6.6	鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明）	1966	60	R4	Ⅱ		点検					点検	設計	主部材:塗装 等		4,114
塩田橋	市道	塩田線	綾部市物部町	34.45	4	ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁	1972	54	R4	Ⅱ		点検					点検		設計	主部材:表面被覆 等	10,106
寺前橋	市道	狭間宮橋線	綾部市物部町	33.9	4.5	ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁	1971	55	R4	Ⅱ	主部材:断面修復 等	点検					点検		設計	主部材:表面被覆 等	19,007
宮橋	市道	狭間宮橋線	綾部市志賀郷町	26.2	4.1	ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁	1971	55	R4	Ⅱ	床版:断面修復 等	点検					点検		設計	主部材:表面被覆 等	19,564
成田橋（既設）	市道	丸山線	綾部市志賀郷町	23.1	6.8	ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁	1967	59	R4	Ⅱ	主部材:断面修復 等	点検					点検				12,931
成田橋（拡幅）	市道	丸山線	綾部市志賀郷町	23.1	6.8	Ｈ型鋼：Ｈ形鋼（合成）	1967	59	R4	Ⅱ	橋台:断面修復 等	点検					点検	設計	主部材:塗装 等		6,893
観音橋	市道	向田線	綾部市志賀郷町	28.6	3.8	Ｈ型鋼：Ｈ形鋼（合成）	1969	57	R4	Ⅱ	橋脚:断面修復 等	点検					点検				7,762
松原橋	市道	向田松原線	綾部市向田町	23.6	4.2	鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明）	1983	43	R4	Ⅱ		点検					点検				1,800
六路屋橋	市道	小貝高津線	綾部市高津町	15.6	4.6	ＰＣ橋：プレテンＴ桁	1965	61	R4	Ⅱ		点検					点検				1,700
松梨橋	市道	松梨線	綾部市下八田町	29.5	3.2	鋼溶接橋：Ｉ桁（合成）	1975	51	R4	Ⅱ		点検					点検				1,800
武吉橋	市道	西地線	武吉町仲蔵７の１	63.2	4.2	鋼溶接橋：Ｉ桁（鋼床版）	1975	51	R3	Ⅰ	点検					点検					4,000
中山橋	市道	中山線	綾部市中山町	21.4	4.7	鋼溶接橋：Ｉ桁（合成）	1975	51	R4	Ⅱ		点検		設計	床版:床版防水工 等		点検				16,926
上端橋	市道	草壁上端線	綾部市睦寄町草壁	23.25	3.5	ＲＣ橋：ＲＣ桁橋（その他）	1977	49	R2	Ⅱ					点検					点検	1,800
森宇橋	市道	有安森宇線	睦寄町稲荷	24.3	2.9	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1965	61	R3	Ⅰ	点検					点検					1,800
井谷橋	市道	市道草壁井谷線	綾部市睦奇町堂ノ下	22.45	3	ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁	1968	58	R2	Ⅱ					点検					点検	1,800
神子谷橋	市道	市道神子谷線	綾部市古屋岡町神子谷下	22.95	3.5	Ｈ型鋼：Ｈ形鋼（不明）	1972	54	R2	Ⅱ	主部材:塗装 等				点検	設計	主部材:塗装 等			点検	4,300
柿長橋	市道	柿長線	綾部市物部町	44.7	3.7	鋼溶接橋：Ｉ桁（合成）	1984	42	R4	Ⅲ	主部材:緊急補修	点検					点検				5,175
早稲谷橋	市道	早稲谷線	古屋岡町ハダカ	27.4	3.7	ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁	1962	64	H28	Ⅱ	点検					点検					1,800
初ノ前橋	市道	市道早稲谷線	綾部市古屋岡町高良	16.5	4.6	ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁	1963	63	R2	Ⅱ					点検					点検	1,700
高屋橋	市道	才ヶ谷線	綾部市物部町	18.2	5.9	ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁	1930	96	R4	Ⅱ	橋脚:断面修復 等	点検					点検				13,723
庵の下橋	市道	庵ノ下線	五泉町吟	18	3.5	Ｈ型鋼：Ｈ形鋼（不明）	1982	44	R3	Ⅱ	点検					点検					1,700
家尻橋	市道	市道水梨1号線	綾部市五泉町家尻	17.4	3.5	Ｈ型鋼：Ｈ形鋼（不明）	1979	47	R2	Ⅱ					点検	設計	主部材:塗装 等			点検	3,374
寺所橋	市道	寺所線	綾部市岡安町	20.4	4.8	鋼溶接橋：Ｉ桁（合成）	1975	51	R4	Ⅱ	床版:断面修復 等	点検					点検				12,890
堂の下橋	市道	西樋ノ口線	綾部市物部町	38	3.6	鋼溶接橋：Ｈ形鋼（合成）	1992	34	R4	Ⅲ	床版:緊急補修 等	点検					点検				25,459
片瀬橋	市道	片瀬線	五津合町片瀬前	28.1	1.8	Ｈ型鋼：Ｈ形鋼（非合成）	1975	51	R3	Ⅱ	点検					点検					1,800
物部橋	市道	物部東町線	綾部市物部町	28.7	7.7	ＰＣ橋：プレテン中空床版	2011	15	R4	Ⅱ		点検					点検				1,800
和田橋	市道	市道安国寺和田線	綾部市安国寺町上桝長	20.4	4.7	鋼溶接橋：Ｉ桁（合成）	1975	51	R2	Ⅱ					点検					点検	1,800
野々下橋	市道	中筋野々下線	綾部市中筋町	19.05	3.6	鋼溶接橋：Ｉ桁（合成）	1973	53	R4	Ⅱ		点検・設計	床版:床版防水工 等				点検				8,399
宮下橋	市道	市道宮ノ下迫田線	綾部市於与岐町宮ノ下	15.7	3.6	鋼溶接橋：Ｉ桁（合成）	1984	42	R2	Ⅱ	主部材:塗装 等				点検					点検	4,203
上八代橋	市道	在中線	古屋岡町仲道	39	3.5	Ｈ型鋼：Ｈ形鋼（不明）	1979	47	R3	Ⅱ	点検					点検					2,200

凡例：◀―▶ 対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	所在地	橋長(m)	幅員(m)	橋梁の種類	架設年度	供用年数	最新点検年次	診断結果（判定）	対策の内容・時期										事業費（千円）
											R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	
出逢橋	市道	白道路仁和線	綾部市仁和町	19.5	5	鋼溶接橋：H形鋼（不明）	1981	45	R4	Ⅱ		点検					点検				1,700
石原橋	市道	石原栗線	綾部市豊里町	64.8	5.2	鋼溶接橋：Ｉ桁（合成）	2001	25	R4	Ⅱ		点検					点検				4,000
光里橋	市道	味方下八田線	京都府綾部市下八田町瀬戸	14.7	6.8	ＰＣ橋：その他（ＰＣ橋）	1966	60	R6	Ⅲ				点検 主部材:緊急補修 等					点検		40,717
沖田橋	市道	志賀郷旧府道線	綾部市志賀郷町	21	6.2	ＰＣ橋：プレテンＴ桁	1961	65	R4	Ⅱ		点検				設計	点検 主部材:表面被覆 等				16,997
上川橋	市道	日向２号線	渕垣町古川	29.6	5	鋼溶接橋：Ｉ桁（合成）	1982	44	R3	Ⅱ	点検					点検					1,800
池ノ谷橋	市道	池ノ谷線	綾部市坊口町	19.5	4.5	鋼溶接橋：H形鋼（不明）	1980	46	R4	Ⅱ		点検					点検				1,700
森ヶ井戸橋	市道	有岡渕垣線	綾部市渕垣町	31.3	4.1	鋼溶接橋：Ｉ桁（合成）	1983	43	R4	Ⅱ		点検					点検				2,200
高尾橋	市道	小呂渕垣線	綾部市渕垣町	29.4	5	鋼溶接橋：Ｉ桁（合成）	1987	39	R4	Ⅱ		点検					点検				1,800
仲溝橋	市道	大石平山線	綾部市七百万石町	15.4	4.5	鋼溶接橋：Ｉ桁（非合成）	1984	42	R4	Ⅱ		点検					点検				1,700
井尻橋	市道	井尻線	綾部市篠田町	17.9	4	鋼溶接橋：H形鋼（不明）	1986	40	R4	Ⅱ		点検					点検				1,700
柿差橋	市道	柿差線	綾部市下八田町	32.8	5	鋼溶接橋：Ｉ桁（合成）	1988	38	R4	Ⅱ		点検					点検	設計	主部材:塗装 等		11,060
姫渡橋	市道	中筋宮の前線	綾部市中筋町	19.05	3.7	鋼溶接橋：Ｉ桁（非合成）	1973	53	R4	Ⅱ		点検					点検				1,700
高柳橋	市道	二瀬川土居付線	中筋町	19.1	3.7	鋼溶接橋：Ｉ桁（非合成）	1979	47	R3	Ⅰ	点検					点検					1,700
位田橋	市道	宮代豊里線	綾部市位田町	344.8	9.5	鋼溶接橋：Ｉ桁（合成）	1994	32	R4	Ⅱ		点検					点検				4,000
下替地跨線橋	市道	市道下替地1号線	京都府綾部市下替地	25	3.8	鋼溶接橋：Ｉ桁（不明）	1992	34	R3	Ⅱ					点検					点検	11,000
延谷川橋	市道	高津旭線	綾部市延町	30.1	9.2	ＰＣ橋：プレテンＴ桁	1991	35	R4	Ⅱ		点検					点検				2,200
中畑橋	市道	市道浅原2号線	綾部市睦合町中畑	15.24	3.8	ＰＣ橋：プレテン中空床版	1996	30	R2	Ⅰ					点検					点検	1,700
鳥居橋	市道	大島上延線	綾部市上延町	15	5.2	ＰＣ橋：プレテン中空床版	1999	27	R4	Ⅰ		点検					点検				1,200
綾部工業団地大橋	市道	綾部工業団地線	綾部市淵垣町	198.03	16.3	ＰＣ橋：ポステン箱桁	1996	30	R6	Ⅲ		設計	主部材:緊急補修 等	点検					点検		171,314
第二高橋	市道	山ノ神線	綾部市志賀郷町	28.7	5	鋼溶接橋：Ｉ桁（不明）	1994	32	R4	Ⅰ		点検					点検				1,800
安井橋	市道	渕垣上八田旧府道線	綾部市岡安町	24.5	7.6	鋼溶接橋：Ｉ桁（合成）	1974	52	R4	Ⅱ		点検					点検				1,800
野口橋	市道	物部鍛冶屋線	綾部市新庄町	20	7.8	ＰＣ橋：プレテン中空床版	1998	28	R4	Ⅰ		点検					点検				1,700
小田橋	市道	新庄小西線	綾部市新庄町	20.4	5.2	ＰＣ橋：プレテン中空床版	2000	26	R4	Ⅰ		点検					点検				1,800
一ツ橋	市道	白道路仁和線	綾部市志賀郷町	22	8.2	ＰＣ橋：プレテン中空床版	1996	30	R4	Ⅱ		点検					点検				1,800
岡倉第２跨道橋	市道	市道大野線	綾部市位田町桧前	38.14	8.6	ＰＣ橋：その他（ＰＣ橋）	1991	35	R2	Ⅱ					点検					点検	2,200
下八田陸橋	市道	市道高津旭線	綾部市下八田町松梨	275.5	8.5	ＰＣ橋：その他（ＰＣ橋）	1988	38	R2	Ⅱ		主部材:緊急補修 等			点検					点検	77,154
大畠跨道橋	市道	市道大畠学校線	綾部市位田町桧前	50.54	8.1	ＰＣ橋：その他（ＰＣ橋）	1991	35	R2	Ⅱ					点検					点検	4,000
岡倉第３跨道橋	市道	市道綾部河守線	綾部市位田町桧前	39.54	6	ＰＣ橋：その他（ＰＣ橋）	1991	35	R2	Ⅰ					点検					点検	2,200
高津新橋	市道	高津旭線	綾部市高津町	24.3	9.2	ＰＣ橋：プレテン中空床版	1998	28	R4	Ⅱ		点検					点検				1,800
新宮橋	市道	白道路仁和線	綾部市志賀郷町	29.5	8.2	ＰＣ橋：ポステンＴ桁	2000	26	R4	Ⅰ		点検					点検				1,800
高木橋	市道	上延岡線	綾部市延町	23.2	6	ＰＣ橋：ＰＣ　床版橋その他	1991	35	R4	Ⅰ		点検					点検				1,800
南新在家橋	市道	南在家線	綾部市延町	17.8	6.2	ＰＣ橋：プレテン中空床版	1988	38	R4	Ⅱ		点検					点検				1,700
新小貝橋	市道	小貝高津線	綾部市小貝町	342.8	10.3	鋼溶接橋：Ｉ桁（合成）	2007	19	R4	Ⅱ		点検					点検				4,000
第一号橋	市道	南大坪天王森線	綾部市青野町	4.65	2.8	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1962	64	R5	Ⅱ	主部材:断面修復 等		点検					点検			2,470
青野橋	市道	綾中青野線	綾部市青野町	4.4	3.4	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1962	64	R5	Ⅱ	主部材:断面修復 等		点検					点検			2,689
堂ノ坪橋	市道	丈尾線	綾部市田野町	6.1	3.3	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1975	51	R5	Ⅰ			点検					点検			1,100
第二号橋	市道	丈尾線	綾部市田野町	4.8	3.4	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1970	56	R5	Ⅰ			点検					点検			1,000
第一号橋	市道	丈尾線	綾部市田野町	5.7	3.3	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1965	61	R5	Ⅱ			点検		設計	主部材:緊急補修 等		点検			6,305
西山橋	市道	堂ノ坪線	綾部市田野町	6.6	3.4	ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁	1973	53	R4	Ⅱ	主部材:断面修復 等	点検					点検				6,201
鳴竹橋	市道	鳴竹東ノ段線	綾部市安場町	7.8	4.4	ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁	1975	51	R4	Ⅱ		点検					点検				1,100
波道谷橋	市道	西ノ段線	綾部市安場町	3	4.3	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1982	44	R6	Ⅱ				点検					点検		1,000
大塚橋	市道	市道青野豊里線	綾部市青野町膳所	6.8	24.4	ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）	2016	10	R2	Ⅰ					点検					点検	1,100

凡例：←→ 対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	所在地	橋長(m)	幅員(m)	橋梁の種類	架設年度	供用年数	最新点検年次	診断結果(判定)	対策の内容・時期										事業費(千円)
											R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	
第一号橋	市道	市道井倉中央線	綾部市井倉新町北大橋	7.55	3.3	ＲＣ橋：その他（ＲＣ橋）	1975	51	R2	Ⅱ					点検					点検	1,100
第一号橋	市道	宮代豊里線	綾部市井倉新町	3.5	17.7	ＰＣ橋：ＰＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）	2004	22	R5	Ⅰ			点検					点検			1,000
第二号橋	市道	宮代豊里線	綾部市井倉町	4.5	5.1	ＲＣ橋：ＲＣ桁橋（その他）	1955	71	R6	Ⅰ				点検					点検		1,000
大将軍橋	市道	上延井倉線	綾部市上延町	16.15	9	ＰＣ橋：プレテン中空床版	2006	20	R4	Ⅰ		点検					点検				1,700
第二号橋(既設部)	市道	上延井倉線	綾部市宮代町	4.7	11	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1970	56	R5	Ⅱ			点検					点検			1,000
第二号橋(拡幅部)	市道	上延井倉線	綾部市宮代町	4.7	11	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1970	56	R5	Ⅱ	←→ 主部材:断面修復 等		点検					点検			2,061
恵福田橋	市道	上延井倉線	綾部市井倉町	11.4	10.5	ＰＣ橋：プレテン中空床版	1996	30	R4	Ⅱ		点検					点検				1,200
長田橋	市道	上延岡線	綾部市岡町	3.7	4.4	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1959	67	R5	Ⅱ			点検					点検			1,000
打越橋	市道	打越線	上延町蛭子６	8.38	3.6	ＲＣ橋：その他（ＲＣ橋）	2019	7	R3	Ⅰ	点検					点検					1,100
えびす橋	市道	打越線	綾部市上延町	7.5	2.9	ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁	1933	93	R6	Ⅲ	設計	←→ 舗装:緊急補修設計費用		点検	←→ 主部材:緊急補修 等				点検		4,901
上原橋	市道	打越線	綾部市上延町	6.05	2.3	鋼溶接橋：Ｈ形鋼（非合成）	1940	86	R5	Ⅱ	←→ 床版:断面修復 等		点検					点検			2,693
西谷橋	市道	高津小貝線	綾部市高津町	10.5	6.4	ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁	1979	47	R4	Ⅱ		点検					点検				1,200
第一号橋	市道	谷口荒倉線	綾部市高津町	3.6	3.7	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1965	61	R6	Ⅰ				点検					点検		1,000
谷口橋	市道	谷口荒倉線	綾部市高津町	10.7	4.7	ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁	1963	63	R4	Ⅱ		点検					点検				1,200
高津橋	市道	大島高津線	綾部市高津町	7	5	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1973	53	R4	Ⅰ		点検					点検				1,100
西地橋	市道	大島高津線	綾部市高津町	7.5	4	ＰＣ橋：プレテン床版	1972	54	R6	Ⅱ				点検					点検		1,100
大門橋	市道	市道鷹栖橋上線	綾部市旭町中ノ下	9.43	5.2	ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）	1999	27	R2	Ⅱ					点検					点検	1,100
真志里橋	市道	味方里線	綾部市里町	3.6	3.9	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1965	61	R6	Ⅰ				点検					点検		1,000
九出川橋	市道	味方下八田線	綾部市下八田町	5.3	4.5	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1971	55	R5	Ⅱ			点検		設計	←→ 主部材:緊急補修 等		点検			5,248
樋本橋	市道	有岡渕垣線	綾部市有岡町	6.7	4.4	ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁	1954	72	R4	Ⅰ		点検					点検				1,100
恋水橋	市道	有岡渕垣線	綾部市有岡町	13.6	4.6	鋼溶接橋：Ｉ桁（合成）	1974	52	R4	Ⅱ		点検					点検				1,200
恋水小橋	市道	有岡渕垣線	綾部市里町	2.96	8	ＰＣ橋：ＰＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）	1961	65	R5	Ⅰ			点検					点検			1,000
第一号橋	市道	多田田坂線	綾部市里町	4.24	4.4	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1942	84	R5	Ⅱ	←→ 主部材:断面修復 等		点検					点検			3,106
宮川橋	市道	多田高倉線	綾部市高倉町	3.1	4.8	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1955	71	R6	Ⅱ	←→ 主部材:断面修復 等			点検					点検		2,663
岸ヶ下橋	市道	小呂中央線	綾部市小呂町	2.9	6	ＰＣ橋：ＰＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）	1985	41	R6	Ⅱ				点検					点検		1,000
天野橋	市道	小呂中央線	綾部市小呂町	4.08	4.4	Ｈ型鋼：Ｈ形鋼（不明）	1954	72	R5	Ⅲ		←→ 主部材:緊急補修 等	点検					点検			6,283
第二号橋	市道	鷹栖下八田線	京都府綾部市鷹栖町	2.7	4.7	ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）	2019	7	R3	Ⅰ	点検					点検					1,000
第三号橋	市道	鷹栖下八田線	綾部市下八田町	5.05	4.4	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1983	43	R5	Ⅰ			点検					点検			1,100
第四号橋	市道	鷹栖下八田線	綾部市下八田町	2.48	4.9	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1971	55	R6	Ⅰ				点検					点検		1,000
太古田橋	市道	鷹栖下八田線	綾部市下八田町	4.35	4.5	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1971	55	R5	Ⅰ			点検					点検			1,000
伊勢山橋	市道	市道奥山線	綾部市釜輪町唐次道ノ上	7.7	4.6	ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁	1963	63	R2	Ⅱ					点検					点検	1,100
後山橋	市道	奥山線	綾部市釜輪町	3.55	4.5	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1959	67	R5	Ⅱ	←→ 主部材:断面修復 等		点検					点検			2,812
奥山三号橋	市道	奥山線	綾部市釜輪町	4	4.3	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1961	65	R5	Ⅱ	←→ 主部材:断面修復 等		点検					点検			2,942
シデヶ谷橋	市道	市道奥山線	綾部市釜輪町皆坪	5.3	4.6	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1962	64	R2	Ⅰ					点検					点検	1,100
有岡橋	市道	有岡里線	綾部市里町	35	8.3	鋼溶接橋：Ｉ桁（合成）	1968	58	R4	Ⅱ		点検					点検		設計 床版	←→ 床版防水工 等	40,062
鹿の子橋	市道	多田里線	綾部市里町	31.2	5.1	鋼溶接橋：Ｉ桁（合成）	1970	56	R4	Ⅱ		点検					点検				2,200
池田橋	市道	野田須地山線	綾部市寺町	8.5	6.3	ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁	1961	65	R4	Ⅱ		点検					点検				1,100
光里陸橋	市道	市道味方里1号船	京都府綾部市下八田	20	9.8	ＰＣ橋：ポステン中空床版	2002	24	R2	Ⅱ					点検					点検	13,000
桝長橋	市道	緩復上桝長線	綾部市安国寺町	22	6	鋼溶接橋：その他（鋼溶接橋）	2006	20	R4	Ⅱ		点検					点検				1,800
原貝橋	市道	花ノ木原貝線	綾部市小畑町	15.8	6.3	ＰＣ橋：プレテン中空床版	1996	30	R4	Ⅰ		点検					点検				1,700
池田橋歩道橋	市道	野田須知山線	綾部市上野町	15.4	2	鋼溶接橋：その他（鋼溶接橋）	1963	63	R4	Ⅱ		点検					点検	設計	←→ 主部材:塗装 等		4,030
奥山橋	市道	奥山林道	京都府綾部市釜輪町奥山口	4.8	3.7	ＲＣ橋：ＲＣ床版橋（その他）	1976	50	R5	Ⅱ			点検					点検			1,000

凡例：◀――▶　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	所在地	橋長(m)	幅員(m)	橋梁の種類	架設年度	供用年数	最新点検年次	診断結果(判定)	対策の内容・時期										事業費(千円)
											R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	
梅迫小橋	市道	梅迫戸倉線	綾部市梅迫町	10.1	3.5	鋼溶接橋：Ｉ桁（合成）	1965	61	R4	Ⅱ		点検					点検				1,200
風呂の谷橋	市道	肘谷宮の前線	綾部市十倉志茂町	8.6	5.1	ＰＣ橋：プレテン中空床版	1996	30	R4	Ⅱ		点検					点検				1,100
辻堂橋	市道	井根線	綾部市井根町	5.2	4	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1965	61	R6	Ⅱ	主部材:断面修復 等			点検					点検		3,448
山の口橋	市道	下八田中央2号線	綾部市下八田町	6.3	2.2	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1959	67	R4	Ⅰ		点検					点検				1,100
日尾橋	市道	勢期安井線	綾部市中筋町	14.95	4	鋼溶接橋：Ｉ桁（合成）	1982	44	R4	Ⅱ		点検					点検				1,200
原田橋	市道	勢期安井線	綾部市上八田町	3	3.5	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1982	44	R6	Ⅱ	主部材:断面修復 等			点検					点検		2,185
石田橋	市道	市道石田中央線	綾部市安国寺町岩鼻向	8.07	4	ＲＣ橋：その他（ＲＣ橋）	1969	57	R2	Ⅱ					点検					点検	1,100
八幡橋	市道	梅迫線	梅迫町八幡田１－７	9.7	2.6	鋼溶接橋：Ｉ桁（合成）	1962	64	R3	Ⅰ	点検					点検					1,100
今北橋	市道	久保延近線	綾部市上杉町	12.4	4.2	ＰＣ橋：プレテン床版	1991	35	R4	Ⅰ		点検					点検				1,200
久保橋	市道	久保延近線	綾部市上杉町	4.9	3.3	ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁	1956	70	R5	Ⅱ			点検					点検・設計	床版:床版防水工	等	4,549
岩王寺橋	市道	岩王寺線	綾部市七百石町	2	4.8	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1984	42	R6	Ⅱ	主部材:断面修復 等			点検					点検		2,072
津谷橋	市道	上杉新道線	綾部市上杉町	6.1	4	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1977	49	R4	Ⅱ	主部材:断面修復 等	点検					点検				3,854
カリナバ橋	市道	見内線	綾部市於与岐町	6.1	4.2	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1972	54	R5	Ⅱ	主部材:断面修復 等		点検					点検			3,999
上ノ谷一号橋	市道	見内線	綾部市於与岐町	6.3	3.3	ＲＣ橋：ＲＣ　中空床版	1960	66	R4	Ⅱ		点検					点検				1,100
出逢橋	市道	見内線	綾部市於与岐町	6	3.5	ＲＣ橋：その他（ＲＣ橋）	1962	64	R5	Ⅰ			点検					点検			1,100
上ノ谷二号橋	市道	見内線	綾部市於与岐町	3.65	6.7	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1972	54	R6	Ⅱ	主部材:断面修復 等			点検					点検		3,761
荒堀橋	市道	見内下村線	綾部市於与岐町	6	4	ＰＣ橋：その他（ＰＣ橋）	1968	58	R5	Ⅱ	主部材:断面修復 等		点検					点検			3,809
宮前橋	市道	黒谷線	綾部市黒谷町	6.6	4.4	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1964	62	R6	Ⅱ	主部材:断面修復 等			点検					点検		4,378
八代橋	市道	黒谷線	綾部市八代町	4.4	4.6	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1968	58	R5	Ⅱ	主部材:断面修復 等		点検					点検			3,285
大谷橋	市道	大谷線	綾部市七百石町	4.8	5.8	ＰＣ橋：ＰＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）	1968	58	R5	Ⅱ			点検					点検			1,000
第一号橋	市道	山入安国寺線	綾部市旭町	2.5	2.9	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1956	70	R6	Ⅰ				点検					点検		1,000
第二号橋	市道	山入安国寺線	綾部市旭町	3.2	3.3	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1956	70	R6	Ⅱ	主部材:断面修復 等			点検					点検		2,192
第四号橋	市道	山入安国寺線	綾部市安国寺町	8	6.2	鋼溶接橋：Ｈ形鋼（合成）	1980	46	R2	Ⅱ	主部材:塗装 等				点検					点検	5,099
前田橋	市道	山入安国寺線	綾部市安国寺町	18.6	5.2	ＰＣ橋：プレテン中空床版	2003	23	R4	Ⅰ		点検					点検				1,700
一の瀬橋	市道	市道角場線	綾部市上野町西ケ窪	7.2	3.5	ＲＣ橋：その他（ＲＣ橋）	1965	61	R2	Ⅱ					点検					点検	1,100
第一号橋	市道	岡中央線	綾部市岡町	3.85	3.5	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1962	64	R5	Ⅱ	主部材:断面修復 等		点検					点検			2,499
第二号橋	市道	岡中央線	綾部市岡町	3.9	4.4	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1959	67	R5	Ⅰ			点検					点検			1,000
南大町二号橋	市道	舘杉ノ木線	綾部市井倉町	2.8	5	ＲＣ橋：ＲＣ桁橋（その他）	1955	71	R6	Ⅱ				点検					点検		1,000
堂本橋	市道	市道広瀬中央線	綾部市広瀬町由里	5.1	5.4	ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）	2001	25	R2	Ⅰ					点検					点検	1,100
井倉橋	市道	井倉大将軍小庄司線	綾部市井倉町	1.75	3.7	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1973	53	R6	Ⅱ	主部材:断面修復 等			点検					点検		1,731
名畑橋	市道	名畑線	綾部市十倉中町	5.28	4.3	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1956	70	R5	Ⅱ			点検					点検			1,100
浅原橋	市道	市道小山線	綾部市睦合町中畑	12.18	4.5	ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁	1959	67	R2	Ⅱ					点検					点検	1,200
真野小橋	市道	浅原線	綾部市睦合町	4.6	4.5	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1957	69	R5	Ⅰ			点検					点検			1,000
岩ノ元橋	市道	市道浅原線	綾部市睦合町岩ノ元	6.6	4	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1969	57	R2	Ⅰ					点検					点検	1,100
堂ヶ迫橋	市道	市道山田線	綾部市八津合町堂賀迫	5.5	4.6	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1993	33	R2	Ⅰ					点検					点検	1,100
大手小橋	市道	瀬尾谷線	綾部市八津合町	9.7	4.6	Ｈ型鋼：Ｈ形鋼（不明）	1955	71	R6	Ⅰ				点検					点検		1,100
どんどん橋	市道	瀬尾谷線	綾部市八津合町	5.6	4.5	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1981	45	R6	Ⅱ	主部材:断面修復 等			点検					点検		3,945
中地橋	市道	瀬尾谷線	綾部市八津合町	7	4	ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁	1963	63	R6	Ⅱ	主部材:断面修復 等			点検					点検		7,462
日置村中橋	市道	日置谷線	綾部市八津合町	4.2	4	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1955	71	R5	Ⅰ			点検					点検			1,000
祖里橋	市道	瀬尾谷片山線	綾部市八津合町	7	5.6	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1981	45	R6	Ⅱ	主部材:断面修復 等			点検					点検		5,525
西地第二橋	市道	大町弓削線	綾部市五津合町京ノ田	6.4	5.1	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1983	43	R2	Ⅰ					点検					点検	1,100
宮小橋	市道	吉田寺内線	綾部市五津合町	4.2	5.2	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1982	44	R5	Ⅰ			点検					点検			1,000

凡例：◀―▶　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	所在地	橋長(m)	幅員(m)	橋梁の種類	架設年度	供用年数	最新点検年次	診断結果（判定）	対策の内容・時期										事業費（千円）
											R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	
別当小橋	市道	別当線	綾部市五泉町	6.7	4.6	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1976	50	R6	Ⅱ	◀―▶ 主部材:断面修復 等			点検					点検		4,579
市野瀬橋	市道	市志線	綾部市五泉町田中	13	5.6	ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁	2003	23	R2	Ⅱ					点検					点検	1,200
兵谷橋	市道	市志線	綾部市五泉町	5.75	4.4	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1965	61	R6	Ⅱ	◀―▶ 主部材:断面修復 等			点検					点検		3,956
宮の腰橋	市道	市道市志線	綾部市五泉町宮ノ腰	11.05	4	ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁	1965	61	R2	Ⅱ					点検					点検	1,200
水梨橋	市道	市道水梨線	綾部市五泉町田中	12.71	4.2	ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁	1956	70	R2	Ⅱ					点検					点検	1,200
宮奥橋	市道	水梨線	綾部市五泉町	4.2	4.5	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1960	66	R5	Ⅱ	◀―▶ 主部材:断面修復 等		点検					点検			3,133
小野田橋	市道	下河原葛尾線	綾部市睦寄町	7.1	4.4	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1970	56	R6	Ⅰ				点検					点検		1,100
古井第一橋	市道	下河原葛尾線	綾部市睦寄町	4	2.2	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1962	64	R5	Ⅰ			点検					点検			1,000
古井第二橋	市道	下河原葛尾線	綾部市睦寄町	2.6	2.2	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1962	64	R6	Ⅱ	◀―▶ 橋台:RC巻立て 等			点検					点検		4,629
口小和木橋	市道	市道口小和木谷線	綾部市故屋岡町平田	8.84	2.7	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1973	53	R2	Ⅱ					点検					点検	1,100
無名三号橋	市道	市道朝根線	綾部市故屋岡町朝根	5	3.1	ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）	1965	61	R2	Ⅱ					点検					点検	1,000
小仲橋	市道	小仲線	綾部市故屋岡町	4.7	3.7	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1972	54	R5	Ⅱ	◀―▶ 主部材:断面修復 等		点検					点検			2,963
於見一号橋	市道	於見線	綾部市光野町	3.6	4.3	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1972	54	R6	Ⅱ				点検					点検		1,000
寺下橋	市道	大唐内線	綾部市老富町	7	4.6	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1960	66	R6	Ⅱ	◀―▶ 主部材:断面修復 等			点検					点検		4,735
大唐内橋	市道	大唐内線	綾部市老富町	6.5	3	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1969	57	R6	Ⅰ				点検					点検		1,100
フラ谷橋	市道	市茅野線	綾部市老富町	4.8	4.6	ＰＣ橋：ＰＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）	1998	28	R5	Ⅰ			点検					点検			1,000
臼谷橋	市道	綾部河守線	綾部市井田町	5.5	4.6	ＰＣ橋：プレテン床版	1983	43	R5	Ⅰ			点検					点検			1,100
大畠二号橋	市道	綾部河守線	綾部市大畠町	4	4.1	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1970	56	R5	Ⅰ			点検					点検			1,000
瀬戸橋	市道	宮ノ越線	綾部市井田町	5.65	6.2	ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）	1992	34	R5	Ⅰ			点検					点検			1,100
戸石橋	市道	宮ノ越線	綾部市位田町	3.45	7.2	ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）	1987	39	R6	Ⅱ				点検					点検		1,000
水分橋	市道	古市場線	綾部市栗町	2.7	2.7	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1991	35	R6	Ⅱ				点検					点検		1,000
ヒル川橋	市道	古市場線	綾部市栗町	4.4	9.3	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1958	68	R5	Ⅱ			点検					点検			1,000
ヒル川上橋	市道	栗中央線	綾部市栗町	3.1	4.5	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1965	61	R6	Ⅱ	◀―▶ 主部材:断面修復 等			点検					点検		2,575
上川橋	市道	栗中央線	綾部市栗町	4.03	4.1	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1980	46	R5	Ⅰ			点検					点検			1,000
貝尻橋	市道	川面線	綾部市栗町	4.35	3	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1958	68	R5	Ⅰ			点検					点検			1,000
出合橋	市道	栗豊里線	綾部市栗町	5.87	4.8	ＰＣ橋：プレテン床版	1930	96	R5	Ⅱ			点検					点検			1,100
町田橋	市道	三宅黒田線	綾部市小西町	4.1	4.6	ＰＣ橋：ＰＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）	1986	40	R5	Ⅰ			点検					点検			1,000
森下一号橋	市道	森下線	綾部市舘町	2.1		ＰＣ橋：ＰＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）	1967	59	R6	Ⅰ				点検					点検		1,000
水車橋	市道	大畠学校線	綾部市大畠町	3.4	6	ＰＣ橋：ＰＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）	1991	35	R6	Ⅱ				点検					点検		1,000
池尻橋	市道	舘大畠線	綾部市舘町	3.3	5.3	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1950	76	R6	Ⅱ				点検					点検		1,000
新池橋	市道	舘大畠線	綾部市大畠町	3	5.2	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1950	76	R6	Ⅱ	◀―▶ 主部材:断面修復 等			点検					点検		2,761
下畷三号橋	市道	舘大畑線	綾部市大畠町	6.3	4.8	ＰＣ橋：プレテン床版	1991	35	R6	Ⅰ				点検					点検		1,100
柵田橋	市道	金谷線	綾部市小畑町	3.56	7	ＰＣ橋：ＰＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）	1995	31	R5	Ⅰ			点検					点検			1,000
土取橋	市道	金谷線	小畑町土取６	7.12	6.1	ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）	1995	31	R3	Ⅰ	点検					点検					1,100
岸下橋	市道	金谷線	綾部市小畑町	2.2	3	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1978	48	R6	Ⅱ				点検					点検		1,000
天王橋	市道	本城奥線	綾部市小畑町	3.85	5.4	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1951	75	R5	Ⅰ			点検					点検			1,000
伊治屋下橋	市道	本城奥原貝線	綾部市小畑町	2	7.6	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1978	48	R6	Ⅱ	◀―▶ 主部材:断面修復 等			点検					点検		2,716
大池橋	市道	奥新庄線	新庄町五反３６	6.9	5	ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）	2008	18	R3	Ⅱ	◀―▶ 点検　主部材:断面修復 等					点検					4,994
六反橋	市道	柿六反線	綾部市鍛冶屋町	20.2	5.2	ＰＣ橋：プレテン中空床版	2011	15	R4	Ⅰ		点検					点検				1,800
初田橋	市道	初田線	綾部市物部町	12.4	4	鋼溶接橋：Ｉ桁（合成）	1970	56	R4	Ⅱ		点検					点検				1,200
天野橋	市道	郷社線	綾部市物部町	8.6	5	ＰＣ橋：プレテン床版	1981	45	R4	Ⅱ		点検					点検				1,100
巡在橋	市道	亀ケ迫赤月坂線	綾部市西坂町	13	3.3	ＰＣ橋：プレテン床版	1984	42	R4	Ⅰ		点検					点検				1,200

凡例：←→　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	所在地	橋長(m)	幅員(m)	橋梁の種類	架設年度	供用年数	最新点検年次	診断結果(判定)	対策の内容・時期										事業費(千円)
											R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	
浄土寺橋	市道	浄土寺線	綾部市西坂町	14	4.2	ＰＣ橋：プレテン中空床版	1990	36	R4	Ⅰ		点検					点検				1,200
立貝橋	市道	立貝線	綾部市西坂町	14.3	4.1	ＰＣ橋：プレテン中空床版	1990	36	R4	Ⅰ		点検					点検				1,200
八幡畷橋	市道	八幡畷線	綾部市西坂町	13.1	5.2	ＰＣ橋：プレテン中空床版	1996	30	R4	Ⅱ		点検					点検				1,200
上川橋	市道	遠坂線	綾部市白道路町	2.6	3.5	ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）	1970	56	R6	Ⅱ				点検					点検		1,000
樋之口橋	市道	遠坂線	綾部市白道路町	4.6	2.4	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1962	64	R5	Ⅱ	主部材:断面修復 等		点検					点検			2,220
柳原橋	市道	遠坂線	綾部市白道路町	8	3.5	ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁	1962	64	R4	Ⅱ		点検					点検				1,100
森坂橋	市道	遠中線	綾部市白道路町	6.3	4	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1970	56	R4	Ⅰ		点検					点検				1,100
松葉子橋	市道	白道路線	綾部市白道路町	6.1	3.6	ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁	1955	71	R5	Ⅱ	橋台:断面修復 等		点検					点検			3,579
殿岡橋	市道	白道路線	綾部市白道路町	5.55	3.5	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1951	75	R5	Ⅱ	主部材:断面修復 等		点検					点検			3,671
江戸畷橋	市道	江戸畷線	綾部市白道路町	6.3	3.5	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1968	58	R4	Ⅱ	主部材:断面修復 等	点検					点検				3,471
田畑橋	市道	田畑線	綾部市白道路町	6.1	4.5	ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁	1955	71	R5	Ⅰ			点検					点検			1,100
小井根橋	市道	須波岐東物部線	綾部市物部町	6.3	5.8	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1983	43	R4	Ⅰ		点検					点検				1,100
松の崎橋	市道	別所線	綾部市別所町	4	5.4	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1974	52	R5	Ⅱ	主部材:断面修復 等		点検					点検			3,438
上ノ段橋	市道	別所線	綾部市別所町	5.45	6.4	ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）	1974	52	R6	Ⅱ				点検					点検		1,100
大西橋	市道	小丸山大阪線	綾部市別所町	5.7	6.7	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1974	52	R5	Ⅰ			点検					点検			1,100
深山橋	市道	深山線	綾部市篠田町	4.4	3.7	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1968	58	R5	Ⅰ			点検					点検			1,000
日和橋	市道	日和線	綾部市内久井町	7.6	3.9	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1953	73	R4	Ⅰ		点検					点検				1,100
宮ノ奥一号橋	市道	金河内線	綾部市金河内町	2.8	10.9	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1976	50	R6	Ⅱ				点検					点検		1,000
久保橋	市道	坊口金河内線	綾部市坊口町	4.2	5.8	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1977	49	R5	Ⅰ			点検					点検			1,000
中坪橋	市道	坊口金河内線	綾部市坊口町	3.14	5.5	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1977	49	R5	Ⅱ	主部材:断面修復 等		点検					点検			2,931
柏在橋	市道	坊口金河内線	綾部市金河内町	11.7	3.5	ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁	1968	58	R4	Ⅱ	主部材:断面修復 等	点検					点検				9,977
六反田橋	市道	仁和坊口線	綾部市坊口町	2.65	4.2	ＰＣ橋：ＰＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）	2020	6	R4	Ⅰ		点検					点検				1,000
貝尻橋	市道	貝尻線	綾部市西方町	13.9	5	ＰＣ橋：プレテン中空床版	1992	34	R4	Ⅱ		点検					点検				1,200
滝ケ鼻橋	市道	貝尻線	綾部市西方町	4.1	4.6	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1982	44	R5	Ⅰ			点検					点検			1,000
室の木橋	市道	貝尻線	綾部市西方町	14.3	5	ＰＣ橋：プレテンＴ桁	1991	35	R4	Ⅰ		点検					点検				1,200
虫田橋	市道	井ノ岡線	綾部市西方町	10	5.2	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1994	32	R4	Ⅰ		点検					点検				1,100
村中二号橋	市道	中村線	綾部市西方町	2.2	4.4	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1994	32	R6	Ⅱ				点検					点検		1,000
中村段橋	市道	中村段線	綾部市私市町	2	2.8	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1958	68	R6	Ⅱ				点検					点検		1,000
由里橋	市道	下村線	綾部市於与岐町	12	3.4	ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁	1970	56	R4	Ⅱ		点検					点検				1,200
由里小橋	市道	下村線	綾部市於与岐町	6.2	3.3	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1967	59	R4	Ⅰ		点検					点検				1,100
下の谷橋	市道	下ノ谷線	綾部市於与岐町	5	3.3	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1972	54	R5	Ⅱ	主部材:断面修復 等		点検					点検			2,874
乙味橋	市道	溝黒線	釜輪町溝黒才ヶ鼻２の４	14.48	3.6	鋼溶接橋：Ｈ形鋼（合成）	1984	42	R3	Ⅱ	点検					点検					1,200
矢所下橋	市道	岩塚矢所線	綾部市釜輪町	6.4	4.1	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1990	36	R6	Ⅱ	橋台:RC巻立て 等			点検					点検		9,381
下田橋	市道	市道下田線	綾部市睦合町下高岸	9.6	3.2	鋼溶接橋：Ｈ形鋼（合成）	1975	51	R2	Ⅱ		設計	主部材:塗装 等		点検					点検	2,739
前田橋	市道	小呂小谷線	綾部市小呂町	4.1	4.4	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1985	41	R6	Ⅱ				点検					点検		1,000
志庭垣小橋	市道	有岡田坂線	綾部市有岡町	13.7	4.3	鋼溶接橋：Ｉ桁（合成）	1957	69	R4	Ⅱ	橋台:断面修復 等	点検					点検				11,589
藤谷一号橋	市道	沖田線	綾部市志賀郷町	5.4	3.6	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1979	47	R5	Ⅰ			点検					点検			1,100
藤谷二号橋	市道	龍昌寺線	綾部市志賀郷町	6.2	3.5	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1975	51	R5	Ⅱ	主部材:断面修復 等		点検					点検			3,521
河原橋	市道	河原線	綾部市志賀郷町	3.2	6.6	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1980	46	R6	Ⅰ				点検					点検		1,000
鳴坂橋	市道	中河原安ノ坂線	綾部市於与岐町	9.6	6.1	ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁	1977	49	R4	Ⅱ	橋台:断面修復 等	点検					点検				14,040
みどり橋	市道	綾高中央線	綾部市岡町	3.8	9.6	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1959	67	R5	Ⅰ			点検					点検			1,000
東橋	市道	綾高西線	綾部市岡町	3.8	4.5	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1965	61	R6	Ⅱ	主部材:断面修復 等			点検					点検		2,930

凡例：◀―▶　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	所在地	橋長(m)	幅員(m)	橋梁の種類	架設年度	供用年数	最新点検年次	診断結果（判定）	対策の内容・時期										事業費（千円）
											R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	
竹本橋	市道	坊口竹本線	綾部市坊口町	6.8	3.4	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1955	71	R4	Ⅰ		点検					点検				1,100
滝ヶ鼻一号橋	市道	西方滝ヶ鼻線	綾部市西方町	3.8	3.6	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1992	34	R5	Ⅱ	◀―▶ 主部材:断面修復 等		点検					点検			2,544
第二号橋	市道	星原西谷線	綾部市星原町	3.5	3.6	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1955	71	R6	Ⅱ				点検					点検		1,000
上町一号橋	市道	梅迫上町線	綾部市梅迫町	6.8	1.9	Ｈ型鋼：Ｈ形鋼（合成）	1962	64	R4	Ⅱ	◀―▶ 橋台:RC巻立て 等	点検					点検	設計	◀―▶ 主部材:塗装 等		7,410
味方平二号橋	市道	味方平線	綾部市味方町	5.4	4.6	ＰＣ橋：プレテン床版	1980	46	R5	Ⅰ			点検					点検			1,100
上杉橋	市道	久保線	綾部市上杉町	5.4	3.3	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1955	71	R5	Ⅰ			点検					点検			1,100
杉ノ木橋	市道	小呂杉ノ木線	綾部市小呂町	3.9	5.1	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1975	51	R5	Ⅰ			点検					点検			1,000
一ツ橋	市道	宇洲荒倉線	綾部市高津町	2.8	4.4	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1965	61	R6	Ⅰ				点検					点検		1,000
美鳩橋	市道	上地市場線	綾部市高津町	4.5	4.3	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1968	58	R5	Ⅱ	◀―▶ 主部材:断面修復 等		点検					点検			3,184
三号橋	市道	上地市場線	綾部市高津町	9.1	2.9	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1965	61	R4	Ⅱ		点検					点検				1,100
第一号橋	市道	平尾中線	綾部市安場町	6.4	3.4	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1973	53	R4	Ⅰ		点検					点検				1,100
西谷橋	市道	西谷線	綾部市八代町	5.1	3.4	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1963	63	R5	Ⅰ			点検					点検			1,100
門一号橋	市道	鳥居野門線	綾部市上杉町	2.15	4.5	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1956	70	R6	Ⅰ				点検					点検		1,000
下田橋	市道	鳥居野門線	綾部市上杉町	4.5	4.4	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1956	70	R5	Ⅱ			点検					点検			1,000
無名一号橋	市道	市道小中白尾線	綾部市故屋岡町小中	5.53	5.5	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1998	28	R2	Ⅰ					点検					点検	1,100
中祖橋	市道	弓削仲根線	綾部市五津合町	4.05	5.6	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1957	69	R6	Ⅱ	◀―▶ 主部材:断面修復 等			点検					点検		3,560
縄手一号橋	市道	縄手線	綾部市五津合町	4.05	4.9	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1957	69	R5	Ⅰ			点検					点検			1,000
殿谷橋	市道	市道天王若宮線	綾部市睦合町在中	5.14	3.2	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1967	59	R2	Ⅰ					点検					点検	1,100
安田橋	市道	市道上行安田線	綾部市於与岐町宮谷	8.03	3.4	ＲＣ橋：その他（ＲＣ橋）	1973	53	R2	Ⅱ					点検					点検	1,100
北谷橋	市道	北谷線	綾部市八代町	4.7	5.5	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1968	58	R5	Ⅰ			点検					点検			1,000
由里ヶ坪橋	市道	下村由里線	綾部市於与岐町	14.2	3	ＲＣ橋：ＲＣ　中空床版	1976	50	R4	Ⅱ	◀―▶ 主部材:断面修復 等	点検					点検				6,009
由里の坪小橋	市道	下村由里線	綾部市於与岐町	5	3.4	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1970	56	R5	Ⅰ			点検					点検			1,000
左古橋	市道	森本川線	綾部市私市町	2.4	4	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1958	68	R6	Ⅱ				点検					点検		1,000
西ノ段橋	市道	市道堂ノ下線	綾部市安場町堂ノ下	7.6	4.8	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1981	45	R2	Ⅰ					点検					点検	1,100
堂ノ本橋	市道	市道門ノ元線	綾部市安場町西ノ段	7.4	4.8	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1983	43	R2	Ⅰ					点検					点検	1,100
北ノ前橋	市道	間島線	綾部市栗町	2.3	2.5	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1930	96	R6	Ⅱ				点検					点検		1,000
薬師谷橋	市道	宮ノ上線	綾部市味方町	3.7	4.6	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1954	72	R5	Ⅱ	◀―▶ 主部材:断面修復 等		点検					点検			2,938
神の前橋	市道	市道早稲谷線	綾部市故屋岡町初ノ前	12.92	4.6	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1969	57	R2	Ⅱ					点検					点検	1,200
下鳴橋	市道	中河原線	綾部市於与岐町	12.1	3.4	ＲＣ橋：ＲＣ　中空床版	1972	54	R4	Ⅱ	◀―▶ 主部材:断面修復 等	点検					点検				8,151
岡橋	市道	岡日東線	綾部市岡町	4.1	3.4	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1962	64	R5	Ⅰ			点検					点検			1,000
大迫橋	市道	新庄村中線	綾部市新庄町	2.5	4.9	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1960	66	R6	Ⅱ				点検					点検		1,000
無名一号橋	市道	市道大岩線	綾部市睦奇町大岩	7.01	2.8	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1963	63	R2	Ⅰ					点検					点検	1,100
荒倉橋	市道	荒倉市場線	綾部市高津町	8.4	4.6	ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁	1963	63	R4	Ⅱ	◀―▶ 主部材:断面修復 等	点検					点検				9,830
八反一号橋	市道	八反１号線	綾部市上延町	3.2	4.1	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1965	61	R6	Ⅱ				点検					点検		1,000
八反二号橋	市道	八反2号線	綾部市上延町	4.5	4.6	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1988	38	R5	Ⅱ	◀―▶ 主部材:断面修復 等		点検					点検			3,312
柳川橋	市道	才ヶ谷線	綾部市白道路町	4.4	5.8	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1932	94	R5	Ⅱ	◀―▶ 橋台:RC巻立て 等		点検					点検			11,774
上村四号橋	市道	上村線	綾部市栗町	4.1	4.1	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1958	68	R5	Ⅰ			点検					点検			1,000
第一号橋	市道	梅迫中町線	綾部市梅迫町	2.3	2.8	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1962	64	R6	Ⅱ				点検					点検		1,000
大藪橋	市道	大島大藪線	綾部市大島町	3.2	4	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1965	61	R6	Ⅱ				点検					点検		1,000
岡倉橋	市道	田野岡倉線	綾部市田野町	10.5	3.5	ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁	1978	48	R4	Ⅲ		点検・設計	◀―▶ 橋台:緊急補修 等				点検				4,839
旭ケ丘一号橋	市道	旭ヶ丘線	綾部市位田町	5.5	4.5	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1965	61	R5	Ⅱ	◀―▶ 主部材:断面修復 等		点検					点検			3,894
外山田二号橋	市道	外山田2号線	綾部市大島町	2.6	4.4	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1965	61	R6	Ⅱ	◀―▶ 主部材:断面修復 等			点検					点検		2,291

凡例：◀―▶　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	所在地	橋長(m)	幅員(m)	橋梁の種類	架設年度	供用年数	最新点検年次	診断結果(判定)	対策の内容・時期										事業費(千円)
											R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	
藤の木二号橋	市道	藤ノ木線	綾部市高津町	4.4	4.3	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1968	58	R5	Ⅱ	◀―▶主部材:断面修復 等		点検					点検			5,271
梶長一号橋	市道	大島梶長線	綾部市大島町	2.5	4.3	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1965	61	R6	Ⅱ	◀―▶主部材:断面修復 等			点検					点検		3,400
新町橋	市道	梅迫新町線	綾部市梅迫町	10.52	2.3	Ｈ型鋼：鋼桁橋（その他）	2019	7	R4	Ⅰ		点検					点検				1,200
樋ノ元一号橋	市道	樋ノ元線	綾部市井倉新町	4.4	5	ＰＣ橋：その他（ＰＣ橋）	1984	42	R5	Ⅱ			点検					点検			1,000
樋ノ元二号橋	市道	樋ノ元線	綾部市井倉新町	4.4	6	ＰＣ橋：その他（ＰＣ橋）	1984	42	R5	Ⅱ			点検					点検			1,000
中筋橋	市道	本城奥村中1号線	綾部市小畑町	4.8	3.3	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1996	30	R5	Ⅱ	◀―▶主部材:断面修復 等		点検					点検			2,788
深田橋	市道	西屋線	綾部市中筋町	5	3.5	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1977	49	R5	Ⅰ			点検					点検			1,000
無名一号橋	市道	市道忠2号線	綾部市忠町坊ノ口	9.4	3.6	鋼溶接橋：Ｈ形鋼（合成）	1973	53	R2	Ⅱ					点検					点検	1,100
板橋	市道	今林線	綾部市睦寄町	5.3	4.2	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1961	65	R6	Ⅲ	設計	◀―▶舗装:緊急補修設計費用		点検	◀―▶主部材:緊急補修				点検		4,744
イガミ一号橋	市道	イガミ線	綾部市光野町	4.4	4	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1972	54	R6	Ⅱ				点検					点検		1,000
家ノ下一号橋	市道	市道家ノ下線	綾部市安国寺町家ノ下	2.8	3.9	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	2018	8	R2	Ⅰ					点検					点検	1,000
石橋二号橋	市道	石橋村中線	綾部市八津合町	3.4	3.2	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1955	71	R6	Ⅱ	◀―▶橋台:断面修復 等			点検					点検		3,456
西田一号橋	市道	西田線	綾部市小貝町	3.1	3.9	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1977	49	R6	Ⅰ				点検					点検		1,000
朝根一号橋	市道	朝根2号線	綾部市故屋岡町	3.2	5.1	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1962	64	R6	Ⅰ				点検					点検		1,000
薬師谷橋	市道	国道薬師谷線	綾部市味方町	4.3	4.6	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1971	55	R5	Ⅰ			点検					点検			1,000
寺内一号橋	市道	寺内村中1号線	綾部市五津合町	4	2.6	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1956	70	R5	Ⅰ			点検					点検			1,000
九反田橋	市道	綾高南線	綾部市上延町	14	4.7	ＰＣ橋：プレテン中空床版	1974	52	R4	Ⅱ	◀―▶橋台:断面修復 等	点検					点検				8,681
穴見橋	市道	内山田山手線	綾部市大島町	2.6	4.7	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1965	61	R6	Ⅱ				点検					点検		1,000
小仲中央一号橋	市道	小仲中央線	綾部市故屋岡町	4.67	2.9	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1972	54	R5	Ⅱ	◀―▶主部材:断面修復 等		点検					点検			2,544
佐古一号橋	市道	府道宮ノ前線	綾部市私市町	2.2	3	ＲＣ橋：ＲＣ桁橋（その他）	1958	68	R6	Ⅱ				点検					点検		1,000
上谷橋	市道	上谷線	綾部市下八田町	2.9	2.5	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1983	43	R6	Ⅱ				点検					点検		1,000
友広一号橋	市道	市道有岡友広線	綾部市有岡町友広	13.1	3.8	鋼溶接橋：Ｉ桁（合成）	1967	59	R2	Ⅱ					点検	◀―▶主部材:緊急補修 等				点検	9,549
友広二号橋	市道	市道有岡友広線	綾部市有岡町志庭垣	13.7	3.7	鋼溶接橋：Ｉ桁（合成）	1968	58	R2	Ⅱ					点検	◀―▶主部材:緊急補修 等				点検	9,901
新八一号橋	市道	小貝旧府道線	綾部市小貝町	2.3	5.7	ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）	1958	68	R6	Ⅱ	◀―▶床版:断面修復 等			点検					点検		2,500
宿ノ橋	市道	高津上地線	綾部市高津町	3.5	3.2	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1965	61	R6	Ⅱ	◀―▶主部材:断面修復 等			点検					点検		2,264
由里橋	市道	由里線	綾部市坊口町	4.27	3.5	Ｈ型鋼：Ｈ形鋼（不明）	1977	49	R5	Ⅱ			点検					点検		設計	1,265
貝尻一号橋	市道	栗貝尻線	綾部市栗町	3.1	2.4	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1930	96	R6	Ⅱ				点検					点検		1,000
佐古一号橋	市道	佐古2号線	綾部市私市町	2.5	3.3	ＲＣ橋：ＲＣ床版橋（その他）	1958	68	R6	Ⅲ		設計	◀―▶舗装:	点検	◀―▶更新				点検		7,595
中村段一号橋	市道	私市中村段線	綾部市私市町	2.2	5.3	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1958	68	R6	Ⅱ				点検					点検		1,000
竹ノ之下一号橋	市道	早田竹ノ下線	綾部市栗町	2.5	2.7	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1967	59	R6	Ⅱ				点検					点検		1,000
木戸口橋	市道	市道木戸口線	綾部市五津合町木戸口	11.5	4.7	ＰＣ橋：プレテン床版	1991	35	R2	Ⅰ					点検					点検	1,200
迫田橋	市道	中河原迫田線	於与岐町	14.4	3	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1969	57	R3	Ⅰ	点検					点検					1,200
市茅野橋	市道	市茅野線	綾部市老富町	5.8	7.1	ＰＣ橋：ＰＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）	2004	22	R5	Ⅰ			点検					点検			1,100
緩復橋	市道	緩復上桝長線	綾部市中筋町	3.7	7	ＰＣ橋：ＰＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）	1974	52	R5	Ⅰ			点検					点検			1,000
小野つけ橋	市道	小野田線	綾部市睦寄町	8.53	4.4	鋼溶接橋：その他（鋼溶接橋）	2013	13	R4	Ⅰ		点検					点検				1,100
寺野橋	市道	上野寺中線	綾部市上野町	10	4.1	ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁	1940	86	R4	Ⅱ		点検					点検				1,100
武中橋	市道	武吉中央線	綾部市武吉町	2.32	3.5	ＰＣ橋：ＰＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）	2020	6	R4	Ⅰ		点検					点検				1,000
風呂谷橋	市道	十倉下線	綾部市十倉下町	9.2	5	ＰＣ橋：プレテン中空床版	1956	70	R6	Ⅰ				点検					点検		1,100
安川橋	市道	奥小西線	綾部市小西町	3.5	4.5	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1973	53	R5	Ⅱ	◀―▶主部材:断面修復 等		点検					点検			2,778
堂ノ奥橋	市道	亀ケ迫赤目坂線	綾部市西坂町	2.05	11	ＰＣ橋：ＰＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）	1996	30	R6	Ⅱ				点検					点検		1,000
岼一号橋	市道	岼西田線	綾部市小貝町	3.4	8	ＰＣ橋：ＰＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）	2001	25	R6	Ⅱ				点検					点検		1,000
岼二号橋	市道	岼西田線	綾部市小貝町	2.2	4.8	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	2001	25	R6	Ⅱ				点検					点検		1,000

凡例：◀―▶　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	所在地	橋長(m)	幅員(m)	橋梁の種類	架設年度	供用年数	最新点検年次	診断結果(判定)	対策の内容・時期										事業費(千円)
											R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	
延二号橋	市道	上延岡線	綾部市延町	2.9	4.8	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1960	66	R6	Ⅱ	◀―▶ 主部材:断面修復 等			点検					点検		2,571
栗一号橋	市道	佃平田線	綾部市栗町	2.1	5.7	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1970	56	R6	Ⅱ				点検					点検		1,000
清水一号橋	市道	清水下地線	綾部市五津合町	4	2.7	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1985	41	R5	Ⅱ	◀―▶ 主部材:断面修復 等		点検					点検			3,438
上村一号橋	市道	上村岼線	綾部市栗町	4.3	5.4	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1958	68	R5	Ⅰ			点検					点検			1,000
上村二号橋	市道	上村岼線	綾部市栗町	4.5	4	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1958	68	R5	Ⅱ	◀―▶ 主部材:断面修復 等		点検					点検			3,044
上村三号橋	市道	上村岼線	綾部市栗町	4	3.3	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1958	68	R5	Ⅰ			点検					点検			1,000
旭一号橋	市道	高津旭線	綾部市旭町	3.4	14	ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）	1971	55	R6	Ⅱ				点検					点検		1,000
滝谷橋	市道	上原中央2号線	綾部市下原町	6.4	3.9	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1950	76	R4	Ⅱ		点検					点検				1,100
舘ノ内一号橋	市道	岡中央3号線	綾部市岡町	3.7	2.8	Ｈ型鋼：Ｈ形鋼（不明）	1962	64	R5	Ⅲ			点検					点検			1,000
第一号橋	市道	野田須知山線	綾部市寺町	2.9	6.2	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1935	91	R6	Ⅰ				点検					点検		1,000
寺田橋	市道	野田須知山線	綾部市寺町	4.35	5.6	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1970	56	R5	Ⅱ	◀―▶ 橋台:RC巻立て 等		点検					点検			11,381
算山橋	市道	野田須知山線	綾部市寺町	4.55	4.1	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1935	91	R5	Ⅱ	◀―▶ 橋台:RC巻立て 等		点検					点検			16,994
野田橋	市道	野田須知山線	綾部市寺町	3.85	4.1	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1935	91	R5	Ⅱ	◀―▶ 橋台:RC巻立て 等		点検					点検			10,934
須知山橋	市道	野田須知山線	綾部市寺町	7.5	5.2	ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁	1959	67	R6	Ⅱ				点検					点検		1,100
第一号橋	市道	梶長団地線	綾部市大島町	3	8.5	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1965	61	R6	Ⅱ				点検					点検		1,000
第一号橋	市道	井根竹ノ下線	綾部市井根町	5.7	2.5	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	2020	6	R4	Ⅰ		点検					点検				1,100
第二号橋	市道	井根竹ノ下線	綾部市井根町	5.2	3.4	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1960	66	R6	Ⅱ	◀―▶ 主部材:断面修復 等			点検					点検		3,096
第一号橋	市道	小嶋久保線	綾部市上杉町	6.4	3.9	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1990	36	R4	Ⅰ		点検					点検				1,100
堂ノ下橋	市道	古屋線	綾部市睦合町	4.1	3.6	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1988	38	R5	Ⅰ			点検					点検			1,000
井上谷橋	市道	市道古屋線	綾部市睦寄町古屋	5.82	3.3	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1971	55	R2	Ⅱ					点検					点検	1,100
坂尻一号橋	市道	坂尻岡ノ段線	綾部市大島町	5.25	8.9	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1968	58	R5	Ⅱ			点検					点検			1,100
第2号橋	市道	肘谷宮ノ前線	綾部市十倉志茂町	2.8	4.4	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1956	70	R6	Ⅱ				点検					点検		1,000
第一号橋	市道	竹西谷線	綾部市新庄町	2.4	3.3	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1970	56	R6	Ⅱ				点検					点検		1,000
第1号橋	市道	井倉東線	綾部市井倉町	4.1	6.7	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1988	38	R5	Ⅱ			点検					点検			1,000
口吉見橋	市道	安場口吉見線	綾部市安場町	4.7	4.5	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1973	53	R5	Ⅰ			点検					点検			1,000
今飼橋	市道	市道今飼鳥垣線	綾部市睦合町今飼	10.04	6.6	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1992	34	R2	Ⅱ					点検					点検	1,200
桜橋	市道	井ノ岡線	綾部市西方町	11.2	5	ＰＣ橋：プレテン中空床版	1992	34	R4	Ⅰ		点検					点検				1,200
八兵衛橋	市道	八兵衛線	綾部市西方町	13.5	5	ＰＣ橋：プレテン中空床版	1992	34	R4	Ⅰ		点検					点検				1,200
岼ヶ前橋	市道	岼ヶ前線	綾部市上杉町	12.4	4.8	ＰＣ橋：プレテン床版	1991	35	R4	Ⅱ		点検					点検				1,200
郡是橋	市道	西町青野線	綾部市青野町	4.6	18.9	ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）	1996	30	R5	Ⅰ			点検					点検			1,000
川原小橋	市道	有岡里線	綾部市里町	2.5	10	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1970	56	R6	Ⅱ	◀―▶ 主部材:断面修復 等			点検					点検		3,809
西ヶ窪橋	市道	西ヶ窪2号線	綾部市上野町	6.4	7.8	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1996	30	R5	Ⅰ			点検					点検			1,100
仲屋敷橋	市道	井倉舘線	綾部市井倉町	3.8	7.6	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1984	42	R5	Ⅱ			点検					点検			1,000
船迫谷橋	市道	舟迫線	綾部市光野町	4.9	4.8	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1961	65	R5	Ⅰ			点検					点検			1,000
舘ノ内橋	市道	斗代舘ノ内線	綾部市岡町	4.9	6.6	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1962	64	R5	Ⅰ			点検					点検			1,000
青野一号橋	市道	青野北8号線	綾部市青野町	4.9	6.6	ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）	2002	24	R5	Ⅰ			点検					点検			1,000
青野2号橋	市道	青野北10号線	綾部市青野町	6.6	6.6	ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）	1975	51	R5	Ⅰ			点検					点検			1,100
青野北橋	市道	青野北16号線	綾部市青野町	4.9	6.6	ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）	1962	64	R5	Ⅰ			点検					点検			1,000
柳原橋（既設）	市道	遠坂線	綾部市白道路町	13	10.8	ＰＣ橋：プレテン床版	1992	34	R4	Ⅰ		点検					点検				1,200
柳原橋(拡幅)	市道	遠坂線	綾部市白道路町	14	10.8	ＰＣ橋：プレテン中空床版	1992	34	R4	Ⅰ		点検					点検				1,200
野原橋	市道	野原線	綾部市栗町	3.2	7	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1985	41	R6	Ⅱ				点検					点検		1,000
長瀬橋	市道	栗橋線	綾部市栗町	3.2	6	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1985	41	R6	Ⅱ				点検					点検		1,000

凡例：◀―▶　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	所在地	橋長(m)	幅員(m)	橋梁の種類	架設年度	供用年数	最新点検年次	診断結果（判定）	対策の内容・時期										事業費（千円）
											R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	
無名一号橋	市道	市道二王門線	綾部市睦合町沼	9.7	12.7	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1992	34	R2	Ⅰ					点検					点検	1,100
綾部工業団地小橋	市道	綾部工業団地線	綾部市高倉町	8.18	24.3	ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）	1996	30	R5	Ⅱ			点検					点検			1,100
井ノ丘橋	市道	西方旧府道線	綾部市西方町	5.5	4.1	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1948	78	R5	Ⅰ			点検					点検			1,100
六條橋	市道	国光松原線	綾部市小畑町	14.2	6.7	ＰＣ橋：プレテン中空床版	1996	30	R4	Ⅰ		点検					点検				1,200
稲郷橋	市道	稲郷南柏原線	綾部市物部町	9.6	3	鋼溶接橋：Ｉ桁（合成）	1980	46	R4	Ⅱ		点検					点検				1,100
池ノ内橋	市道	大畠線	大畠町	7.3	4.6	ＰＣ橋：斜張橋（その他）	1990	36	R3	Ⅰ	点検					点検					1,100
柳原橋	市道	柳原岸本線	綾部市白道路町	14	4.8	ＰＣ橋：プレテン中空床版	1980	46	R4	Ⅱ		点検					点検				1,200
桧前橋	市道	野本馬越線	綾部市井田町	6.45	6.7	ＰＣ橋：ＰＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）	1991	35	R5	Ⅰ			点検					点検			1,100
瀬戸橋	市道	宮ノ越線	綾部市位田町	3.6	7.5	ＰＣ橋：ＰＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）	1992	34	R5	Ⅰ			点検					点検			1,000
南ノ前橋	市道	市道井根南ノ前線	綾部市井根町中筋	8.33	3	ＰＣ橋：プレテン床版	1975	51	R2	Ⅱ					点検					点検	1,100
北大橋橋	市道	井倉北大橋2号線	綾部市井倉新町	4.8	5	鋼溶接橋：Ｉ桁（鋼床版）	1984	42	R5	Ⅲ	◀―▶ 主部材:緊急補修 等		点検					点検			7,191
辻橋	市道	渕垣上八田旧府道線	綾部市中筋町	2.7	7.7	ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）	1974	52	R6	Ⅱ				点検					点検		1,000
塚ノ下橋	市道	弓削2号線	綾部市五津合町	4.5	5.4	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1957	69	R5	Ⅰ			点検					点検			1,000
共栄橋	市道	下替地旧府道1号線	綾部市下替地町	4.1	3.6	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1960	66	R5	Ⅰ			点検					点検			1,000
馬場下一号橋	市道	井倉中央線	綾部市青野町	2.4	9.4	ＰＣ橋：ＰＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）	1973	53	R6	Ⅰ				点検					点検		1,000
馬場下二号橋	市道	井倉中央線	綾部市青野町	2.4	16.9	ＰＣ橋：ＰＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）	1973	53	R6	Ⅰ				点検					点検		1,000
青野井倉一号橋	市道	青野井倉線	綾部市井倉新町	3.3	15.7	ＰＣ橋：ＰＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）	2000	26	R5	Ⅰ			点検					点検			1,000
田野団地橋	市道	田野団地線	綾部市田野町	10.1	7.7	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1996	30	R4	Ⅱ		点検					点検				1,200
小仲中村一号橋	市道	小仲村中1号線	綾部市故屋岡町	4.6	2.4	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1972	54	R5	Ⅱ	◀―▶ 主部材:断面修復 等		点検					点検			2,246
奥山口橋	市道	奥山線	綾部市釜輪町	5.4	4	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1961	65	R6	Ⅰ				点検					点検		1,100
不毛橋	市道	市道睦志3号線	綾部市五津合町不毛	9.35	3.1	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1964	62	R2	Ⅱ					点検					点検	1,100
広畑橋	市道	西迫広畑線	綾部市西坂町	14.1	4.8	ＰＣ橋：プレテン中空床版	1980	46	R4	Ⅱ		点検					点検				1,200
西迫橋	市道	西迫大工谷線	綾部市西坂町	13.2	4.8	ＰＣ橋：プレテン床版	1981	45	R4	Ⅰ		点検					点検				1,200
久保田橋	市道	久保田森安線	綾部市西方町	14.2	3.9	ＰＣ橋：プレテン床版	1982	44	R4	Ⅰ		点検					点検				1,200
第二号橋	市道	宮代豊里線	綾部市井倉町	3.9	16.8	ＰＣ橋：ＰＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）	2004	22	R5	Ⅰ			点検					点検			1,000
大畑橋	市道	市道浅原3号線	綾部市睦合町歩瀬谷	11.57	3.8	ＰＣ橋：プレテン中空床版	1995	31	R2	Ⅰ					点検					点検	1,200
山内橋	市道	山内2号線	綾部市睦寄町	4.93	2.7	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	2020	6	R4	Ⅰ		点検					点検				1,000
東鵜ノ目橋	市道	市道郡是裏線	綾部市青野町六反目	5.55	4.8	ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）	2016	10	R2	Ⅰ					点検					点検	1,100
井倉石風呂橋	市道	井倉石風呂2号線	綾部市井倉新町	3.5	2	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1970	56	R5	Ⅰ			点検					点検			1,000
滝ヶ谷大橋	市道	梅迫十倉線	綾部市十倉志茂町	16.6	4	鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明）	1991	35	R4	Ⅱ	◀―▶ 橋台:断面修復 等	点検					点検				9,170
篠田七百石線第1号橋	市道	篠田七百石旧府道線	綾部市七百石町	2.9	7	ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版	1960	66	R6	Ⅱ	◀―▶ 主部材:断面修復 等			点検					点検		3,292
合　計　（千円）											570,628	193,988	99,224	201,623	89,423	103,259	119,281	73,541	114,325	113,653	1,678,945
